




DOC-002
STRATEGIC PLAN

Plan Maestro de 24 Meses hacia el Concept Car de Combustión

AUTOR:	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v1.1	FECHA:	15.07.2026

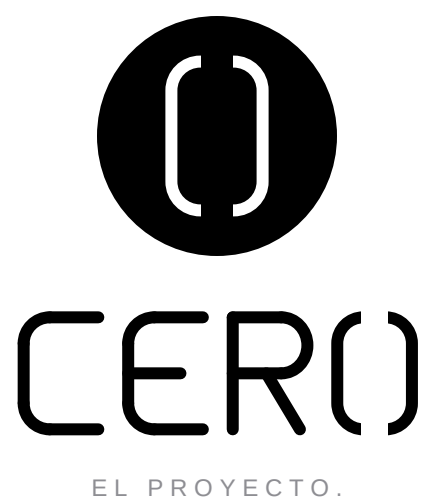

1. Horizonte de Planificación (28 Meses)

El objetivo estratégico principal de CERO es diseñar, ensamblar, homologar e instrumentar un coche de carreras monoplace ligero, propulsado por un motor de motocicleta de combustión interna, en un plazo de 28 meses. La inclusión del proceso de homologación individual vial (ITV) exige ampliar nuestro horizonte de los 24 meses iniciales a los 28 meses reales, incorporando ensayos de laboratorio de emisiones, pruebas de ruido dinámico (ISO 362) y frenado de doble circuito en la fase final.

2. Cronograma de Fases del Proyecto

Fase 1 (Mes 1 - Mes 3): Lanzamiento, captación de la comunidad de internet, y debate sobre la elección de motor (GSX-R 600/1000).

Fase 2 (Mes 4 - Mes 6): Diseño CAD conceptual de la arquitectura del chasis tubular y cockpit (Onshape gratuito).

Fase 3 (Mes 7 - Mes 12): Ingeniería detallada, optimización por simulación (FEA y CFD), y validación de componentes de moto.

Fase 4 (Mes 13 - Mes 18): Selección de partners de taller y corte láser, obtención de acero 4130 y soldadura del chasis (Rolling Chassis).

Fase 5 (Mes 19 - Mes 21): Montaje del motor de moto, cadena, escape a medida, cableado básico e instrumentación.

Fase 6 (Mes 22 - Mes 24): Acabado de carrocería minimalista de aluminio/fibra, pruebas dinámicas en circuito y puesta a punto.

Fase 7 (Mes 25 - Mes 28): Pruebas de laboratorio IDIADA/INTA, ajuste de emisiones Euro 6, y obtención de matrículas ordinarias de calle.

3. Alternativas Estratégicas y Puntos de Decisión

Si en el Mes 12 no se ha conseguido financiación o partners de mecanizado para el chasis, el proyecto pivotará hacia un diseño híbrido basado en un chasis comercial modificado, priorizando la ejecución física sobre el diseño a medida.
