




DOC-003
MASTER ROADMAP

Hitos, Entregables y Dependencias Críticas

AUTOR:	GESTIÓN DE PROYECTOS CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v11.0	FECHA:	15.07.2026

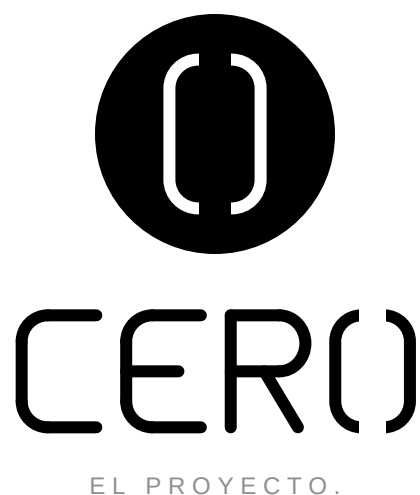

1. Secuencia Lógica de Construcción


El desarrollo del vehículo sigue una ruta crítica lineal. No se puede encargar el corte de tubos de acero 4130 cromoly antes de congelar las dimensiones del chasis (Fase 3), y no se puede cerrar el CAD trasero del chasis sin haber escaneado físicamente el motor Suzuki GSX-R de desguace para verificar la alineación del piñón de transmisión con el eje trasero.

2. Gráfico del Gantt de Desarrollo

A continuación se ilustra la planificación temporal de 28 meses:

3. Tabla de Hitos y Puertas de Control (Gates)

Checklist obligatorio para avanzar de fase:

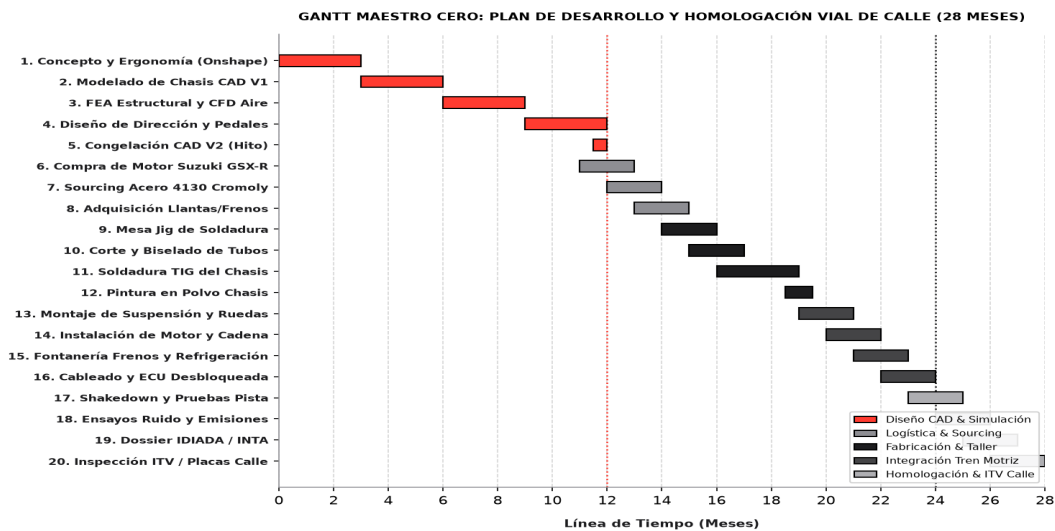

Hito	Fase	Entregable Clave	Límite	Estado
MS-0	Fase 1	Freeze de Requerimientos Técnicos Básicos y Motor GSX-R	Mes 3	Completado
MS-1	Fase 2	Diseño Conceptual CAD y Cockpit en Onshape	Mes 6	En Progreso
MS-2	Fase 3	Diseño Detallado e Ingeniería (FEA/CFD)	Mes 12	Planificado





MS-3	Fase 4	Adquisición y Ensamblaje de Chasis Tubular	Mes 18	Planificado
MS-4	Fase 5	Integración Tren Motriz y Electrónica V1	Mes 21	Planificado
MS-5	Fase 6	Lanzamiento y Pruebas en Pista Privada	Mes 24	Planificado
MS-6	Fase 7	Dossier IDIADA / INTA y Obtención de Placas de Calle	Mes 28	Planificado
