




DOC-003
MASTER ROADMAP

Hitos, Entregables y Dependencias Críticas

AUTOR:	GESTIÓN DE PROYECTOS CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v16.0	FECHA:	15.07.2026

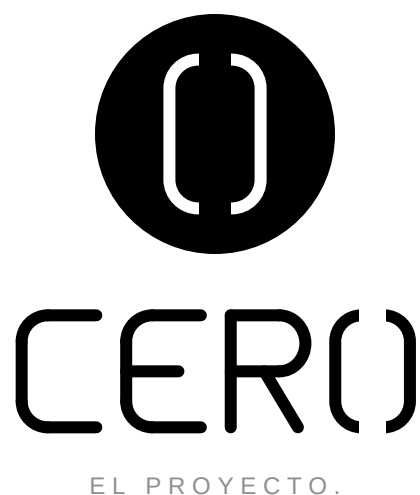

1. Cronograma de Hitos (Master Gantt)


El desarrollo del vehículo se organiza en un cronograma lineal de 28 meses. Las dependencias críticas son el escaneo 3D del motor y del inversor elegidos por los ingenieros antes de cerrar el CAD trasero del chasis, y el diseño de aristas según normativa peatonal para el dossier IDIADA/INTA. Cada retraso en una fase de diseño afectará directamente al inicio del ensamblaje físico en el taller colaborador. La planificación se ha estructurado con amortiguadores temporales (buffers) de 15 días entre fases críticas para mitigar demoras en el suministro de metalurgia. La ruta crítica pasa obligatoriamente por el congelado del diseño de suspensión y dirección, ya que sus anclajes dictan la triangulación del chasis delantero.

2. Gráfico del Gantt de Desarrollo

A continuación se ilustra gráficamente la planificación temporal y fases del proyecto:

3. Tabla de Puertas de Control (Gates)

A continuación se dejan indicadas las fases y entregables clave del roadmap:

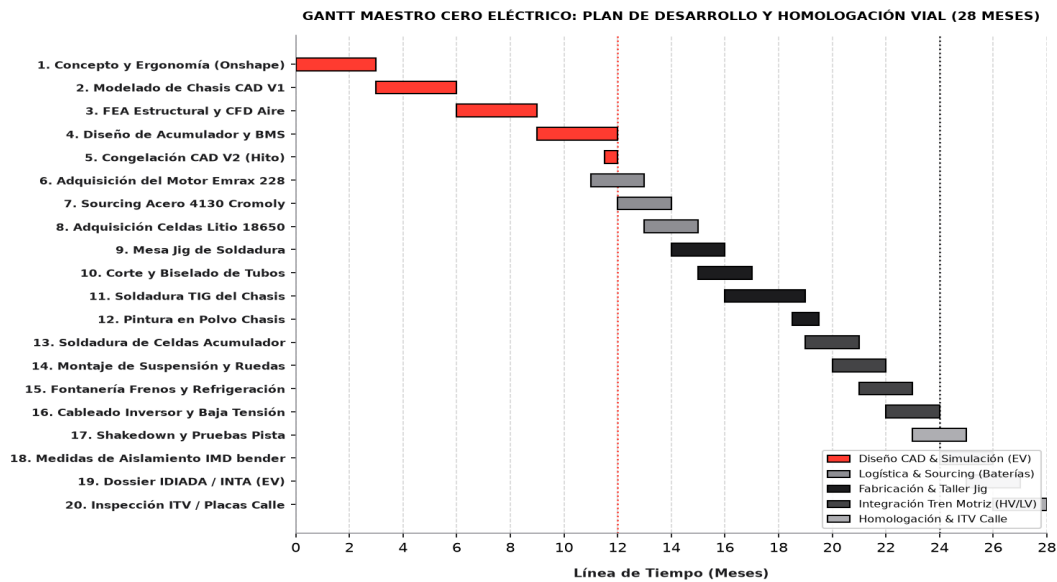

Hito	Fase	Entregable Clave	Límite	Estado
MS-0	Fase 1	Freeze de Requerimientos Técnicos Básicos y Búsqueda de Garaje	Mes 3	Completado



MS-1	Fase 2	Diseño Conceptual CAD en Onshape y Lanzamiento Patreon	Mes 6	En Progreso
MS-2	Fase 3	Prototipo de Madera 1:1 (Mockup) y Cierre de Alianzas	Mes 12	Planificado
MS-3	Fase 4	Adquisición y Ensamblaje de Chasis Tubular en Garaje	Mes 18	Planificado
MS-4	Fase 5	Integración Tren Motriz y Cableado de Control V1	Mes 21	Planificado
MS-5	Fase 6	Lanzamiento de Prototipo y Pruebas en Pista	Mes 24	Planificado
MS-6	Fase 7	Dossier IDIADA / INTA y Obtención de Placas de Calle	Mes 28	Planificado
