


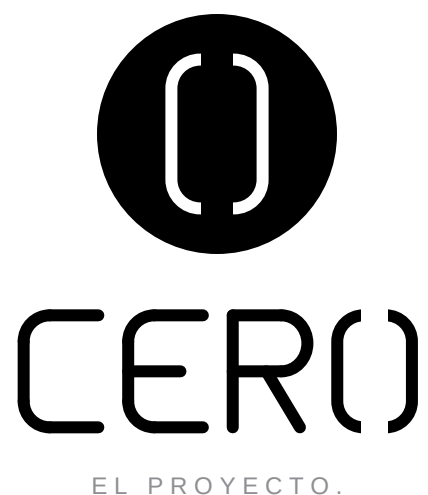

DOC-025

CRITICAL PROJECT AUDIT AND RISK ANALYSIS

Auditoría de Viabilidad y Análisis Crítico del Ecosistema de Proyecto

AUTOR:	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v16.0	FECHA:	15.07.2026



1. Bucle de Muerte de la Tracción de 0€

En el día 1, proponer canjes de branding con 0 seguidores es inviable. Debemos concentrar el Mes 1-3 en ganar visibilidad técnica compartiendo diseños y simulaciones impactantes antes de contactar con patrocinadores. Si intentamos conseguir tubos de acero cromoly o espacio en talleres sin un canal de YouTube con tracción, la tasa de rechazo será del 100%. La estrategia pasa por crear expectación compartiendo el proceso de diseño en redes antes de realizar llamadas de sourcing físico.

2. Riesgo de Falta de Espacio Físico (Garaje)

El montaje físico no puede iniciarse sin un local seguro. El riesgo de no encontrar un taller colaborador o garaje asequible se mitiga mediante un plan de trueque publicitario con escuelas de Formación Profesional o pequeños talleres locales en Móstoles que busquen visibilidad online. Si fallan las negociaciones, se retrasará la compra de materiales físicos y se extenderá la fase de diseño CAD virtual en Onshape, minimizando el burn-rate de caja.

3. Logística Oculta y Gastos Hormiga

Radial, gases TIG, discos, furgoneta de transporte y tornillería sumarán unos 300-600€ el primer año. Se financiarán con la caja de Patreon del Mes 4, prohibiendo compras grandes hasta cubrir consumibles. Es común que los proyectos amateur fracasen por subestimar estos gastos hormiga (discos de amoladora, varillas de aporte, gas argón, tornillería estructural grado 8.8), consumiendo el presupuesto antes de comprar las piezas principales del monoplaça.

