




DOC-002
STRATEGIC PLAN

Plan de Negocio a 28 Meses y Modelo Operativo

AUTOR:	DIRECCIÓN ESTRATÉGICA CERO	ESTADO:	APROBADO
VERSIÓN:	v15.0	FECHA:	15.07.2026

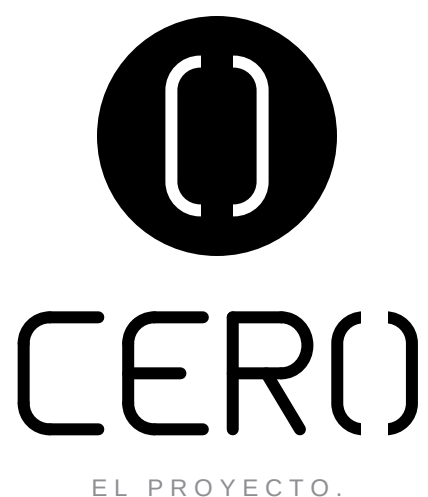

1. Horizonte y Fases de Ejecución

El proyecto se extiende a 28 meses para incorporar de forma segura la fase de homologación de calle en España (ITV individual):

- Fase 1 (Mes 1-3): Lanzamiento, reclutamiento y elección del motor eléctrico (Emrax 228). Fase puramente conceptual centrada en la narrativa y la captación de talento en LinkedIn y Discord. Se congelan las dimensiones generales del monoplaza.
- Fase 2 (Mes 4-6): CAD conceptual del chasis y cockpit en Onshape. Se inician las simulaciones de ergonomía y colocación de mandos. Lanzamiento de Patreon.
- Fase 3 (Mes 7-12): Ingeniería de detalle y simulaciones FEA/CFD. Se congelan los puntos de suspensión del monoplaza y se simulan cargas de flexión estática y torsión torsional bajo cargas dinámicas de 5G.
- Fase 4 (Mes 13-18): Alianzas y soldadura del chasis tubular en taller colaborador. Se adquieren los tubos de acero cromoly 4130 y se fabrica la mesa jig.
- Fase 5 (Mes 19-21): Montaje del tren motriz, inversor Bamocar D3, Orion BMS y doble circuito de frenos Wilwood.
- Fase 6 (Mes 22-24): Carrocería final de composite y pruebas dinámicas (slalom, frenado) en pista privada.
- Fase 7 (Mes 25-28): Pruebas en laboratorios oficiales IDIADA/INTA y matriculación ordinaria para vías públicas.

2. Modelo de Financiación Mixto

Operación inicial con 0€ basándose en sponsors y canjes de publicidad. La compra de las celdas de litio 18650 para el acumulador y la electrónica del BMS se financia en el Mes 12 con la caja acumulada del Patreon de la comunidad, lanzado en el Mes 4. Todo incremento de costes imprevisto en los ensayos mecánicos se cubrirá mediante campañas especiales de merchandising. El Core Team no realizará aportaciones de capital de su propio bolsillo, asegurando la sostenibilidad del bootstrapping puro durante toda la fase de desarrollo virtual. La estrategia comercial se centra en asociar marcas de componentes (frenos, amortiguadores, llantas) que busquen visibilidad en la serie de vlogs.

3. Plan de Contingencia y Rutas Alternativas

Si en el Mes 12 la recaudación es insuficiente para la compra de las celdas o del metal, se retrasará el encargo del corte de tubos 4130 cromoly, extendiendo el diseño CAD virtual y lanzando retos adicionales de patrocinio en redes viales. El diseño virtual continuará optimizándose en Onshape, realizando más iteraciones en OpenFOAM.



En caso de que un taller colaborador retire el espacio físico cedido para el montaje del chasis tubular, se activará el Plan B: trueque comercial con institutos de formación profesional mecánica en la zona sur de Madrid, ofreciéndoles acceso directo a los planos de ingeniería para sus asignaturas prácticas de soldadura y automoción a cambio del uso de sus instalaciones durante los fines de semana. Si el motor Emrax 228 resulta muy costoso, se estudiará la pivotación a un motor síncrono de imanes permanentes comercial de menor coste, rediseñando la placa adaptadora del diferencial.
