

# CERO

EL PROYECTO.

**DOC-003**

## MASTER ROADMAP

*Hitos, Entregables y Dependencias Críticas*

|          |                           |         |            |
|----------|---------------------------|---------|------------|
| AUTOR:   | GESTIÓN DE PROYECTOS CERO | ESTADO: | APROBADO   |
| VERSIÓN: | v14.0                     | FECHA:  | 15.07.2026 |



## 1. Cronograma de Hitos (Master Gantt)


El desarrollo del vehículo se organiza en un cronograma lineal de 28 meses. Las dependencias críticas son el escaneo 3D del motor de moto antes de cerrar el CAD trasero del chasis, y el diseño de aristas según normativa peatonal para el dossier IDIADA/INTA. Cada retraso en una fase de diseño afectará directamente al inicio del ensamblaje físico en el taller colaborador. La planificación se ha estructurado con amortiguadores temporales (buffers) de 15 días entre fases críticas para mitigar demoras en el suministro de metalurgia.

## 2. Gráfico del Gantt de Desarrollo

A continuación se ilustra gráficamente la planificación temporal y fases del proyecto:

## 3. Tabla de Puertas de Control (Gates)

A continuación se detallan los entregables obligatorios por fase:

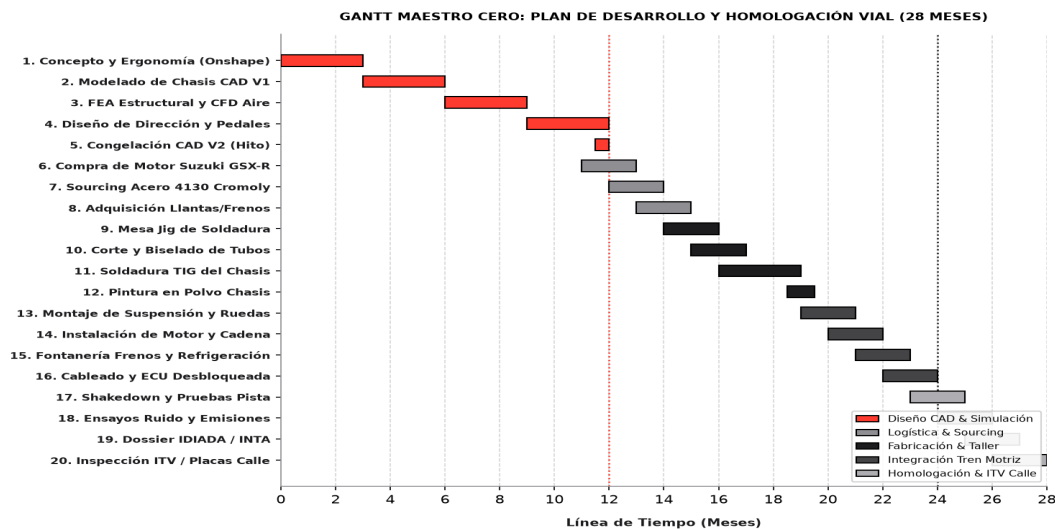

| Hito | Fase   | Entregable Clave                                        | Límite | Estado      |
|------|--------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|
| MS-0 | Fase 1 | Freeze de Requerimientos Técnicos Básicos y Motor GSX-R | Mes 3  | Completado  |
| MS-1 | Fase 2 | Diseño Conceptual CAD and Cockpit en Onshape            | Mes 6  | En Progreso |



|      |        |                                                      |        |             |
|------|--------|------------------------------------------------------|--------|-------------|
| MS-2 | Fase 3 | Diseño Detallado e Ingeniería (FEA/CFD)              | Mes 12 | Planificado |
| MS-3 | Fase 4 | Adquisición y Ensamblaje de Chasis Tubular           | Mes 18 | Planificado |
| MS-4 | Fase 5 | Integración Tren Motriz y Electrónica V1             | Mes 21 | Planificado |
| MS-5 | Fase 6 | Lanzamiento y Pruebas en Pista Privada               | Mes 24 | Planificado |
| MS-6 | Fase 7 | Dossier IDIADA / INTA y Obtención de Placas de Calle | Mes 28 | Planificado |
